

Акт
осмотра выполненных работ, выполненных в рамках реализации
муниципальным образованием «Будановский сельсовет»
Золотухинского района Курской области национального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в Курской области за 9
месяцев 2019 года

с. Будановка

25.11.2019 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 27.1 раздела I Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Курской области на 2019 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты Курской области от 26.12.2018 года № 19/1-2018, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Курской области от 22.11.2019 года № 115.

2. Цель контрольного мероприятия: эффективное и целевое использование средств областного бюджета, направленных на реализацию национального проекта «Формирование современной городской среды в Курской области».

3. Срок проведения контрольного мероприятия: 25.11.2019 года.

4. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, платежные и первичные документы, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, направленными на реализацию региональных проектов (программ) в Курской области. Фактически выполненные объемы работ в рамках реализации региональных проектов (программ) в Курской области за 9 месяцев 2019 года.

5. Объекты контрольного мероприятия: Администрация Будановского сельсовета Золотухинского района

6. Проверяемый период: 9 месяцев 2019 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Постановлением Администрации Курской области от 28.02.2019 года №162-па «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год» муниципальному образованию МО «Будановский сельсовет» Золотухинского района предусмотрена субсидия в объеме 1 755,2 тыс. рублей.

Между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Администрацией Будановского сельсовета Золотухинского района заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии бюджету муниципального образования «Будановский сельсовет» Золотухинского района Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку государственных программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 29.03.2019 года № 38612412-1-2019-001.

Согласно п. 2.1 соглашения № 38612412-1-2019-001, объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского поселения Будановского сельсовета на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2019 году 1 894,6 тыс. рублей.

Согласно п. 2.2 Соглашения № № 38612412-1-2019-001, объем субсидии, предоставляемой в 2019 году из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Будановский сельсовет» Золотухинского района, составил 1 755,2 тыс. рублей.

В целях реализации национального проекта, совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Будановский сельсовет» Золотухинского района постановлением администрации Будановского сельсовета от 19.12.2017 № 295 (в ред. от 28.03.2019 года №37) утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Будановского сельсовета Золотухинского района на 2018-2022 годы»

На собрании жителей д. Будановка принято решение принять участие Администрации Будановского сельсовета на получение гранта и реализации проекта, направленного на благоустройство общественной территории Сквер на пересечении улиц Советская и Гвардейская в д. Будановка, Будановского сельсовета Золотухинского района, с оказанием безвозмездной помощи (протокол схода граждан д. Будановка Золотухинского района от 19.10.2018 года).

Согласно справки Администрации Будановского сельсовета Золотухинского района численность населения Будановского сельсовета Золотухинского района по состоянию на 01.01.2019 года составляет 3 395 чел.

За 9 месяцев 2019 года на реализацию регионального проекта «Формирование современной городской среды в Курской области» МО «Будановский сельсовет» Золотухинского района предусмотрена субсидия в размере 1 755,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 755,2 тыс. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений).

№ п/п	Наименование органа местного самоуправления	Предусмотрено		Кассовый расход		% исполнения
		Всего	в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	Всего	в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	
1	Будановский сельсовет Золотухинского района	1 894,6	1 755,2	1 894,6	1 755,2	100,0
	<i>Благоустройство общественных территорий</i>	1 894,6	1 755,2	1 894,6	1 755,2	100,0

тыс. рублей

Размер финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования МО «Будановский сельсовет» Золотухинского района за счет средств местного бюджета составляет 139,4 тыс. рублей.

Администрацией Будановского сельсовета Золотухинского района заключены договоры:

- № К-2-19 от 25.02.2019г. с ИП Лазарева А.В. на оказание услуг по разработке дизайн-проекта и сметной документации по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования, д.Будановка, Золотухинского района, Курской области: Сквер на пересечении улиц Советская и Гвардейская на сумму 80,0 тыс. рублей.

- № 129-СБ-19 от 27.03.2019г. с АУКО «Облгосэкспертиза» о предоставлении государственной услуги по проведению проверки сметной документации «Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования д.Будановка, Золотухинского района, Курской области: сквер на пересечении улиц Советская и Гвардейская» по проверке сметной документации «Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования д.Будановка, Золотухинского района, Курской области: сквер на пересечении улиц Советская и Гвардейская» на сумму 10,0 тыс. рублей.

Администрацией Будановского сельсовета Золотухинского района заключен муниципальный контракт от 07.06.2019 г. № 0144300024119000001-01 с ООО «УКС» на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования, д. Будановка, Золотухинского района, Курской области: сквер на пересечении улиц Советская и Гвардейская на сумму 1 786,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ в течение 30 дней. Дополнительным соглашением от 01.07.2019 года №1 увеличена стоимость государственного контракта, что составила 1 804,6 тыс. рублей

Работы приняты по актам выполненных работ от 02.07.2019 года №1, от 02.07.2019 года №2 и оплачены по платежным поручениям от 12.07.2019 года №543306 – 1 786,6 тыс. рублей, от 12.07.2019 года №543310 – 18,0 тыс. рублей.

Раздел 1: плитка тротуарная декоративная – 292 м², камни бортовые 264 м.

Раздел 2: Шахматная площадка: плитка тротуарная декоративная – 65 м², камни бортовые 32 м., гранит керамический 22,2 м²:

Раздел 3 и 4: Постамент: плитка тротуарная декоративная – 50 м², бортовые камни 51 шт.,

Раздел 5 и 6: Площадка для игр: скамья бульварная без спинки 8 шт., урна металлическая 3 шт., Беседка «Эконом» 2 шт., детский игровой комплекс, шахматы гигантские 100см.

Раздел 7: Ограждение: устройство металлического ограждения.

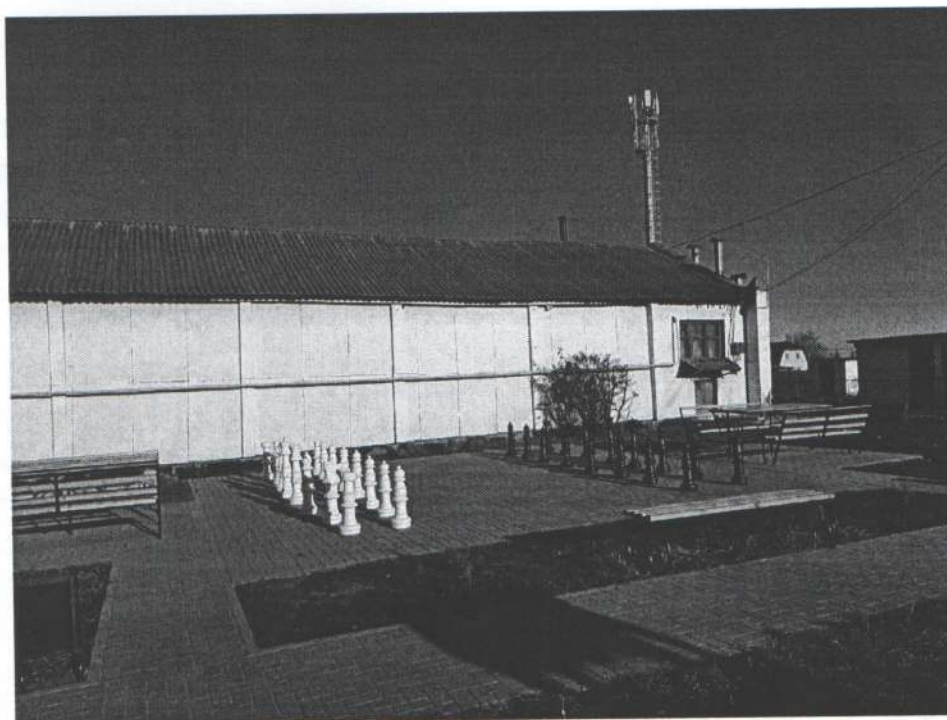


Фото: шахматная площадка



Фото: площадка для игр

В рамках проведения контрольного мероприятия «Мониторинг и контроль разработки и реализации региональных проектов (программ) в Курской области национального проекта «Жильё и городская среда» за 9 месяцев 2019 года» 25.11.2019 года работниками Контрольно-счетной палаты Курской области - заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Курской области А.В. Бреховым, главным консультантом Контрольно-счетной палаты Курской области И.Е. Халеевым, консультантом

Контрольно-счетной палаты Курской области Ю.С. Гайнацкой проведена выборочная проверка объемов выполненных за 9 месяцев 2019 года работ в рамках реализации в муниципальном образовании «Будановский сельсовет» Золотухинского района национального проекта «Формирование комфортной городской среды, в том числе работ по благоустройству общественной территории «Сквер на пересечении улиц Советская и Гвардейская в д. Будановка, Золотухинского района».

В ходе проведенного при участии Главы МО «Будановский сельсовет» Золотухинского района С.И. Алутина осмотра и выборочной проверки объемов выполненных работ установлено, что согласно акту выполненных работ формы КС-2 от 02.07.2019 года №1 приняты работы по устройству плитки тротуарной декоративной в объеме 407 м², фактическое наличие - 416,6 м².

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Курской области


_____ А.В. Брехов

Главный консультант
Контрольно-счетной палаты
Курской области


_____ И.Е. Халеев

Консультант
Контрольно-счетной палаты
Курской области


_____ Ю.С. Гайнацкая

Глава Будановского сельсовета
Золотухинского района


_____ С.И. Алутин

Главный специалист-эксперт


_____ Г.В. Новикова
